Příloha č.2

Modernizace TT v úseku Měnírna - Brandl

dokončení celého úseku s vazbou na so 205 a práce v úseku 2

Sdružení COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení
1	**204 - 2 Zajištění svahů v oblouku**	**64 dny**	**2.2. 15**
2	204 č. 2, reprofilace skalní stěny	14 dny	2.2. 15
3	204 č. 2, ochranné sítě	14 dny	1.4. 15
4	**615 projekt kotvení konzol TV do skály**	20 dny	18.2. 15
5	**615 osazení konzol TV na 204 - 2**	15 dny	13.3. 15
6	**205 Záruční zeď km 0,417-0,605 vpravo**	**56 dny**	**9.2. 15**
29	**206 Opěrná zeď km 0,635-0,778 vpravo**	**75 dny**	**16.2. 15**
30	206 kamenný dřík	14 dny	16.2. 15
31	206 hydroizolační nátěry	5 dny	4.3. 15
32	206 zásyp stěny vč. Drenáže	21 dny	10.3. 15
33	206 římsa	25 dny	3.4. 15
34	206 zábradlí	10 dny	28.4. 15
35	**504 Přeložka STL - změna projektu**	30 dny	12.1. 15
36	**504 schválení RDS**	30 dny	16.2. 15
37	**504 Přeložka NTL plynovodní přípojky pro č.p. 729**	13 dny	23.3. 15
38	**323 napojení svodů z budovy ČD**	6 dny	6.4. 15
39	**427 VO tramvajové tratě a zastávek MHD**	**17 dny**	**6.5. 15**
40	427 pokládka kabelů	10 dny	6.5. 15
41	427 montáž a svitidel	7 dny	16.5. 15
42	**616 Trakční kabely**	**60 dny**	**14.3. 15**
43	616 pokládka chrániček	50 dny	14.3. 15
44	616 pokládka kabelů	10 dny	6.5. 15
45	**617 Zabezpečovací zařízení**	10 dny	6.5. 15
46	**615 Definitivní trolejové vedení**	**35 dny**	**2.3. 15**
47	615 zakládání STV u 205 a 206	20 dny	2.3. 15
48	615 osazení STV	5 dny	25.3. 15
49	615 trakce	10 dny	31.3. 15
50	**práce ŘSD = kanalizace**	45 dny	16.3. 15
51	**práce ŘSD = silniční obruby**	14 dny	2.5. 15
52	**110 Chodníky v Liberecké ulici**	**24 dny**	**16.5. 15**
53	110 chodníky vpravo	5 dny	2.6. 15
54	110 chodníky vlevo	24 dny	16.5. 15
55	**604 Rekonstrukce TT v návaznosti na 205**	**80 dny**	**3.4. 15**
56	604 žlab u OS 206	14 dny	3.4. 15
57	604 dlážděná vozovka k budově ČD	24 dny	17.4. 15
58	604 odkop pro stavby železnic	24 dny	7.4. 15
59	604 zřízení trativodů	15 dny	19.4. 15
60	604 úprava pláně	8 dny	4.5. 15
61	604 zřízení štěrkopískové vrstvy (10 cm)	4 dny	12.5. 15
62	604 štěrk	4 dny	16.5. 15
63	604 montáž koleje v ose NT1 na ocel pražce	7 dny	20.5. 15
64	604 pokládka obrub	6 dny	27.5. 15
65	604 svařování kolejnic	5 dny	27.5. 15
66	**604 doštěrkování před ASP - celý úsek**	6 dny	2.6. 15
67	**604 vyrovnání ASP v celém úseku**	3 dny	8.6. 15
68	**604 doštěrkování po ASP v celém úseku**	6 dny	11.6. 15
69	**604 terénní úpravy a dokončovací práce**	18 dny	2.6. 15
70	**802 Vegetační úpravy**	21 dny	1.6. 15
71	**dokončení předávací dokumentace, DSPS atd**	30 dny	27.5. 15
72	**Dokončení díla**	1 den	26.6. 15
73	**109.0 ŘSD, vozovka Liberecká**	7 dny	16.5. 15

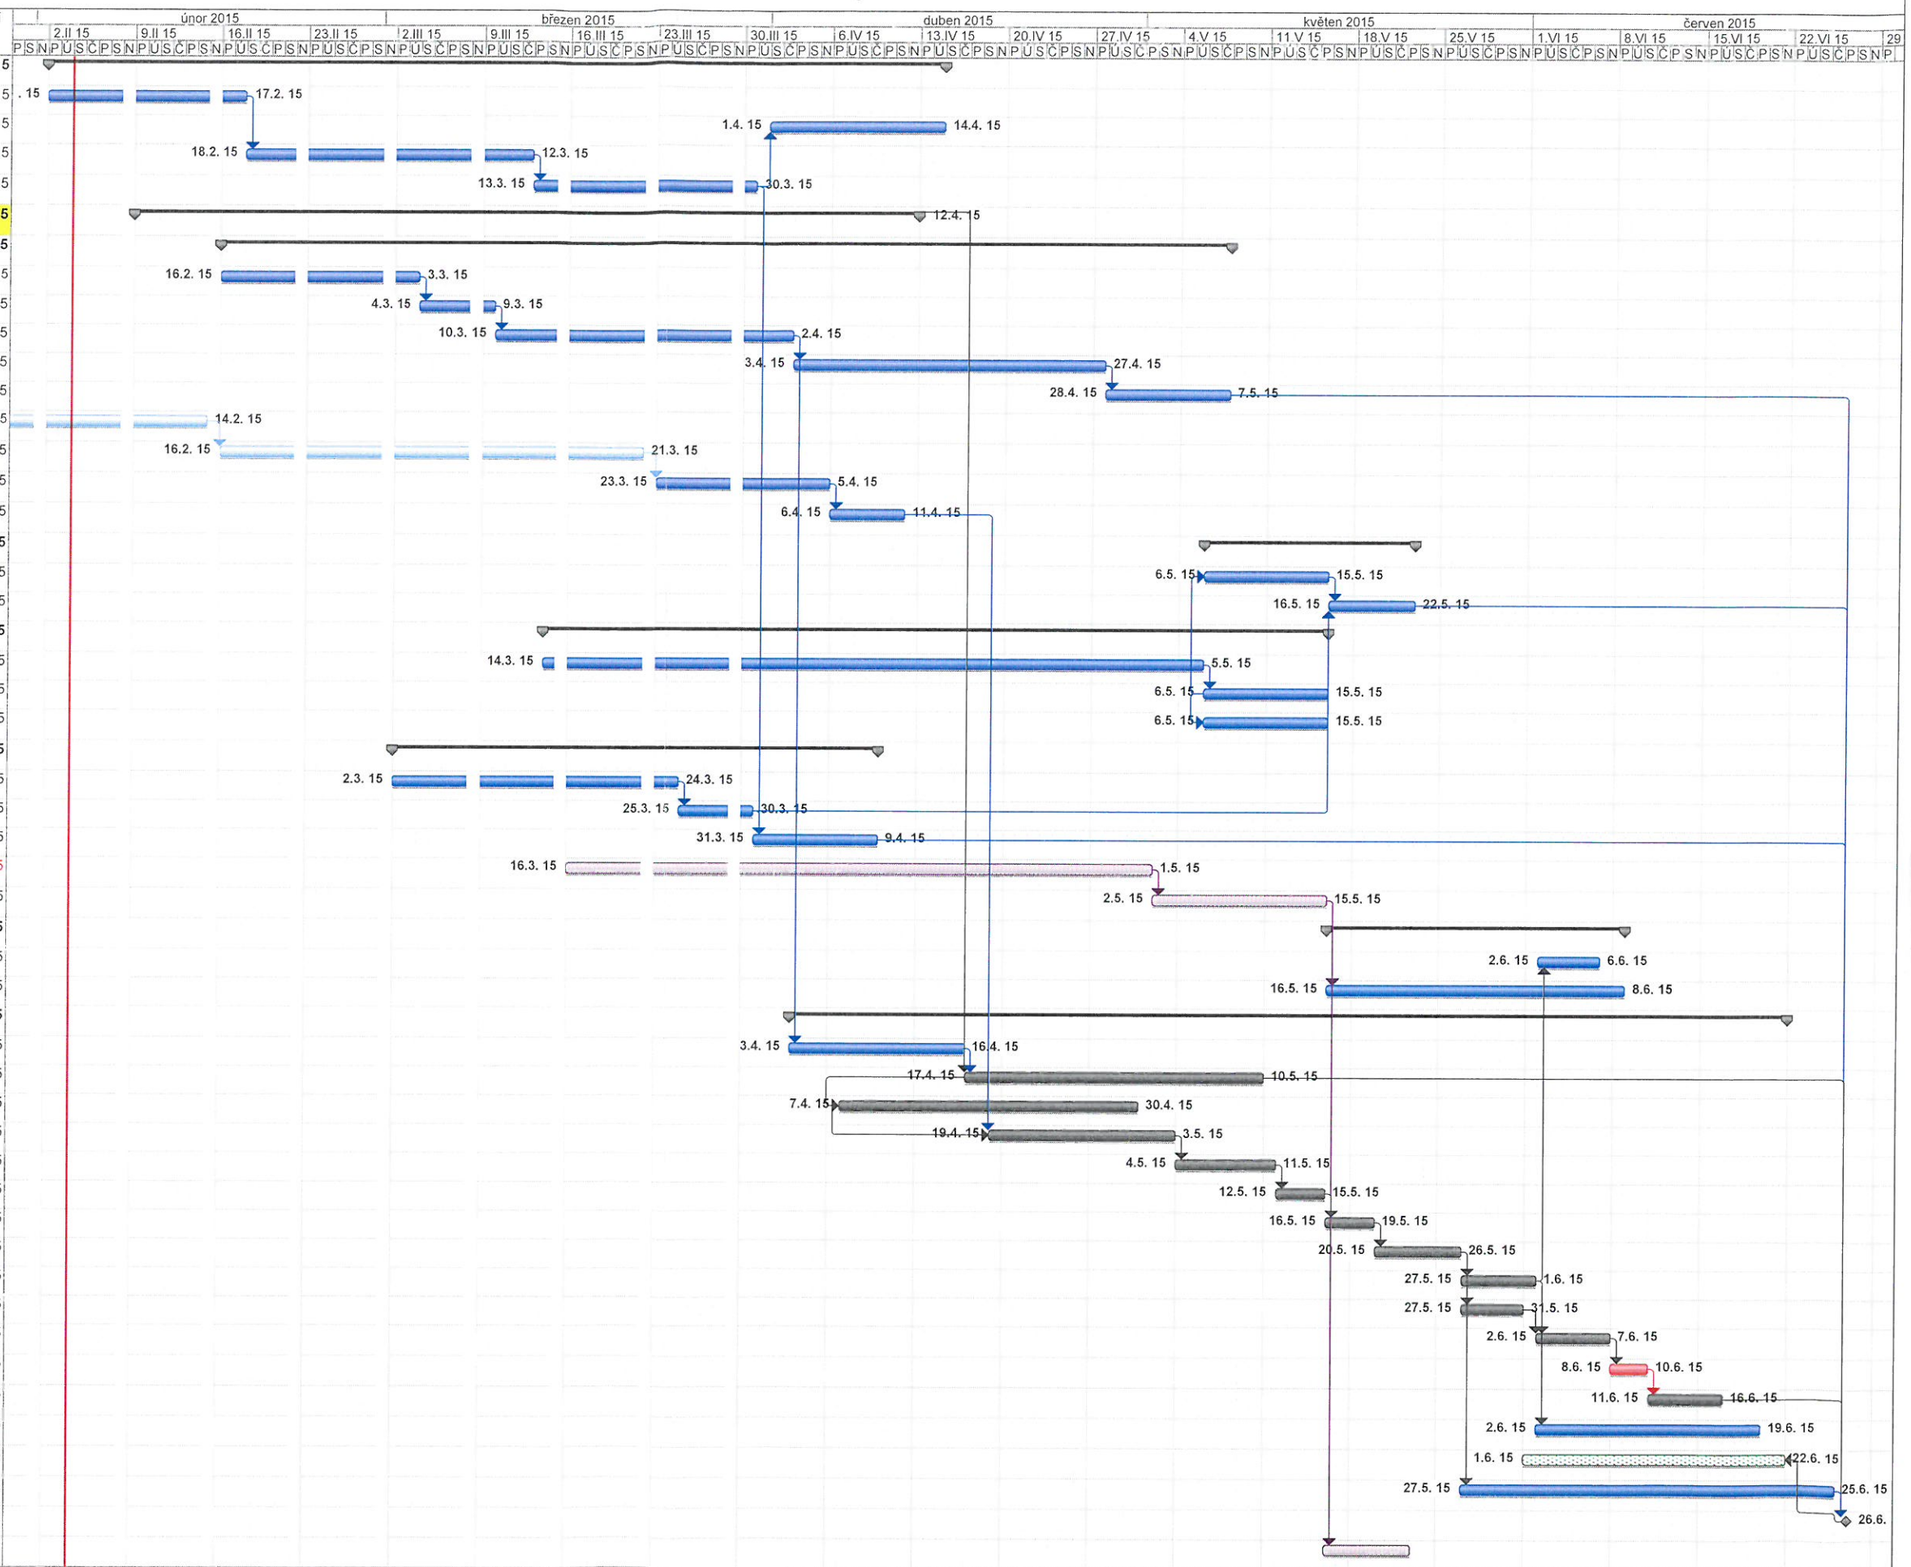
únor 2015
březen 2015
duben 2015
květen 2015
červen 2015
2.II 15
9.II 15
16.II 15
23.II 15
2.III 15
9.III 15
16.III 15
23.III 15
30.III 15
6.IV 15
13.IV 15
20.IV 15
27.IV 15
4.V 15
11.V 15
18.V 15
25.V 15
1.VI 15
8.VI 15
15.VI 15
22.VI 15
29
P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č
