



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Č. smlouvy zhotovitele: D001/2014/3009

Č. smlouvy objednatele: 8/14/1100 SHKS

I.

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: TEWIKO systems, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66
460 07 Liberec VII – Horní Růžodol,
IČ: 25 47 28 87
Zastoupené Radimem Kozákem, jednatelem

/dále jen zhotovitel/

II.

Předmět, účel a místo plnění

1. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Veřejnou zakázkou – předmětem smlouvy se rozumí realizace akce „NEKLANOVA, MALÁ, PUŠKINOVA - OBNOVA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ“.

2. Předmět plnění:

- Jedná se o regeneraci tří malých dětských hřišť v Liberci, a to v ulici Neklanova, Malá, a Puškinova. Konkrétně se jedná o 685/1,685/2, k.ú. Ruprechtice, p.p.č. 1352/1 Vesec u Liberce a p.p.č 163/1, k.ú. Pilínkov. Dětská hřiště budou obnovena dle projektů firmy ALB plus spol. s r.o. z roku 2013, které jsou přílohou č.1 této smlouvy.

- DH Neklanova:

V současné době je na ploše instalován pouze pingpongový stůl, lavičky a pískoviště. Stávající dožilé obruby budou vybourány a pískoviště bude zvětšeno a opatřeno dřevěnými sedáky. Stávající zeleň bude zachována. Do plochy budou osazeny 4 nové herní prvky vyžadující dopadovou plochu (drobný kačírek). Herní prvky musí mít veškerá osvědčení a musí splňovat všechny bezpečnostní normy, dále musí být vyrobeny z kvalitních materiálů, které jsou odolné povětrnostním vlivům. Do prostoru bude doplněn mobiliář o jednu lavičku a jeden odpadkový koš, který má zadavatel již nakoupen tzn., že součástí stavby bude pouze instalace mobiliáře.

Specifikace jednotlivých herních prvků:

pružinové houpadlo

závěsná houpačka: jeden sedák

malý kolotoč: kovový

malá skluzavka: nerezový kluzák

- DH Malá

Do plochy budou osazeny tři nové herní prvky pro menší děti a pískoviště. Herní prvky nevyžadují zbudování dopadové plochy. Stávající zeleň bude dle možnosti zachována, nebo přesazena dle potřeby. Herní prvky musí mít veškerá osvědčení a musí splňovat všechny bezpečnostní normy, dále musí být vyrobeny z kvalitních materiálů, které jsou odolné povětrnostním vlivům. Do prostoru bude doplněn mobiliář o jednu lavičku a jeden odpadkový koš, který má zadavatel již nakoupen tzn., že součástí stavby bude pouze instalace mobiliáře.

Specifikace jednotlivých herních prvků:

pružinové houpadlo

malý kolotoč: kovový

malá skluzavka: nerezový kluzák

- DH Puškinova:

V současné době se na ploše nachází pouze staré pískoviště, které bude vybouráno, bude nově zvětšeno. Stávající zeleň bude zachována, pouze se odstraní tři pařezy. Do plochy budou osazeny 3 nové herní prvky pro menší děti nevyžadující dopadovou plochu. Herní prvky musí mít veškerá osvědčení a musí splňovat všechny bezpečnostní normy, dále musí být vyrobeny z kvalitních materiálů, které jsou odolné povětrnostním vlivům. Do prostoru bude osazen mobiliář v počtu 1 lavička + 1 odpadkový koš, který má zadavatel již nakoupen tzn., že součástí stavby bude pouze instalace mobiliáře.

Specifikace jednotlivých herních prvků:

pružinové houpadlo

překlápěcí houpačka: kovová

malá skluzavka: nerezový kluzák

- Vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění případných dohod se správcem a vlastníky sítí v rámci realizace stavby.

3. Místo plnění:

Město Liberec, ulice Neklanova, Malá, a Puškinova, p.p.č. 685/1,685/2, k.ú.Ruprechtice, p.p.č. 1352/1 Vesec u Liberce a p.p.č 163/1, k.ú. Pilínkov.

4. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je regenerace plochy dětských hřišť v ulici Neklanova, Malá, a Puškinova, p.p.č. 685/1,685/2, k.ú.Ruprechtice, p.p.č. 1352/1 Vesec u Liberce a p.p.č 163/1, k.ú. Pilínkov.

III.

Termín plnění

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu této smlouvy

Dokončení a předání stavby: 24.10.2014 (termín je maximální a nepřekročitelný)

1. Při stanovení a plnění termínů bude brán zřetel na vliv klimatických podmínek při plnění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
3. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě.

IV.

Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a je oběma smluvními

stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH	461 650,- Kč
Daň z přidané hodnoty 21%	96 947,- Kč
Cena celkem vč. DPH	558 597,- Kč

2. Dohodnutá cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému, kvalitnímu a úplnému provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
3. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec z roku 2014, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě.
4. Podkladem pro stanovení ceny je oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č.2). Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného výkazu výměr v případě snížení rozsahu prací a dodávek.
6. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

V.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě konečné faktury po dokončení a protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní od jejího prokazatelného doručení objednateli, kde přílohou bude odsouhlasený předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VI. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v rozsahu 36 měsíců od jeho dokončení a protokolárního předání objednateli.
2. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
3. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé klimatickými excesy, živelnými událostmi, případně zásahem cizí osoby.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit v záruční době zjištěné reklamované vady, přičemž je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad do pěti dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (e-mailem, poštou, faxem). Termín pro odstranění vad je 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady nebo klimatické podmínky dohodnuta lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní vady v uvedené lhůtě, je objednatel dále oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vzniklé a vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne přijetí písemné výzvy.
5. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
6. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

VII Sankce

1. V případě nesplnění termínů stanovených touto smlouvou o dílo se sjednávají následující smluvní pokuty:
 - a) při nesplnění jakéhokoli konkrétně stanoveného termínu plnění, např. dokončení díla, předání díla objednateli, odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu, nastoupení k projednání reklamační vady, odstranění vady v záruční lhůtě a další, se sjednává smluvní pokuta ve výši **2 000,- Kč za každý den prodlení** (objednatel zohlední klimatické podmínky, tato skutečnost bude potvrzena ve stavebním deníku).
 - b) při nezaplacení faktury doručené objednateli v termínu splatnosti může zhotovitel požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
2. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každý jednotlivý případ**.
3. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklou neplněním podmínek této smlouvy.

VIII.

Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně a včas, aby mohl předat dílo podle podmínek této smlouvy a platných předpisů a v dohodnutém termínu.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla.
3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Objednatel požaduje pro plnění této smlouvy pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetí osobě min. ve výši 2 000 000 Kč, přičemž toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
6. Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

IX.

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele v kvalitě a termínu.
2. Neplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínů plnění dohodnutých prací.

X.

Subdodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných subdodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální

písemný seznam všech svých subdodavatelů.

3. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele a v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

XI.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
 2. Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
 - a) dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.
 3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla o více jak 10 dní
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 90 dní
 4. Nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (čl.I.), je zhotovitel nebo objednatel povinen nejpozději do 30-tidnů o těchto změnách informovat druhou stranu.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.
5. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Příloha č. 1: projektová dokumentace
Příloha č. 2: oceněný výkaz výměr


V Liberci dne 30.9.2014

TEWIKO systems, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66
460 06 LIBEREC
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

Za zhotovitele

Radim Kozák
jednatel

V Liberci dne 30.9.2014




Za objednatele

Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města Liberce

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 56 - Dětské hřiště Puškinova

číslo a název SO: IO 7.1 -

číslo a název rozpočtu: 701 - Dětské hřiště

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	102720	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní opatření dodavatele (ochrana chodců, napojení na MK) dle potřeby	KČ	1,000	1 000	1 000
2	102730	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dle potřeby - podzemní IS - odsouhlasí TDI	KČ	1,000	2 000	2 000
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1		Zemní práce				3 000
3	112214	ODSTRANĚNÍ PAREŽŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM včetně odvozu na skládku a skládkovného a zásypu jam	KUS	3,000	1 300	3 900
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ stávající pískoviště, včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	20,000	300	6 000
5	12271	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 1-4 včetně odvozu na skládku a skládkovného, s příplatkem za ztlžený přesun v tl. 0,1-0,3 m, starý písek, část po pařezech, 10% navíc	M3	6,000	350	2 100
6	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek do pískoviště nového	M3	2,700	600	1 620
7	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH travnaté plochy poškozené mechanizací v době výstavby z vhodného vytěženého humusu - uvedení do původního stavu - dohumusování + osetí (odborný odhad)	M2	5,000	1 000	5 000
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 dopadová plocha	M2	35,000	250	8 750
9	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ nakoupený humus pro dozelenění kolem pískoviště v tl. 0,1-0,15 m, 10% navíc	M3	8,250	150	1 238
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	60,000	75	4 500
1		Zemní práce				33 108
9		Ostatní konstrukce a práce				
11	916711	UPEVNĚNÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - DOD A MONTÁŽ D+M provozní řád + tabulka publicity (300*400 mm) - upřesní se dle nabídky dodavatele	KUS	1,000	3 460	3 460

12 93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ lavička - pouze montáž, dodávka objednatel	KUS	1,000	1 400	1 400
13 93610a	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ D+M 3 prvky + písčoviště včetně zemních prací - výčet TZ	KPL	1,000	79 217	79 217
14 93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ odpadkový koš - pouze montáž	KUS	1,000	680	680
9	Ostatní konstrukce a práce				84 757
	Celkem				120 865

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 50 - Dětské hřiště Neklanova

číslo a název SO: IO 4.2 -

číslo a název rozpočtu: 701 - Dětské hřiště

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	1 000	1 000
		dopravní opatření dodavatele (ochrana chodců, napojení na MK) dle potřeby				
2 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	2 000	2 000
		dle potřeby - odsouhlasí TDI - podzemní IS				
0		Všeobecné konstrukce a práce				3 000
1		Zemní práce				
3 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	16,800	300	5 040
		stávající pískoviště, včetně odvozu na skládku a skládkovného				
4 12271		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 1-4	M3	31,977	350	11 192
		včetně odvozu na skládku a skládkovného s příplatkem za ztižený přesun v tl. 0,3 m, rozptýlová plocha, 10% navíc				
5 17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,524	590	18 009
		kačírek dle výběru investora - pro dopadové plochy zrnitosti 2-8 mm do výšky pádu 1,5 m, tl. 0,3 m, 5% navíc				
6 17680a		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,700	590	1 593
		písek do pískoviště				
7 18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M3	5,000	1 000	5 000
		travnaté plochy poškozené mechanizací v době výstavby z vhodného vytěženého humusu- uvedení do původního stavu - dohumusování + osetí (odborný odhad)				
8 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ	M2	96,900	150	14 535
		dopadová plocha				
9 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,750	600	1 650
		nakoupený humus pro dozelenění kolem pískoviště v tl. 0,1-0,15 m, 10% navíc				
10 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	30,000	75	2 250
1		Zemní práce				59 269
9		Ostatní konstrukce a práce				

11	916711	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000	3 460	3 460
12	91721	D+M provozní řád + tabulka publicity (300*400 mm) - upřesní se dle nabídky dodavatele				
13	93610	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU	M	42,735	350	14 957
14	93610a	D+M do betonu s boční opěrkou, ohraničení dopadové plochy, 5% navíc				
15	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	KUS	1,000	1 400	1 400
16	97611	lavička - pouze montáž - dodávka objednatel				
		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	KPL	1,000	127 887	127 887
		D+M 4 prvky + pískoviště včetně zemních prací - výčet TZ	KG	1,000	680	680
		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ				
		odpadkový koš - pouze montáž	KPL	1,000	3 800	3 800
		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ				
		pingpongový stůl včetně odvozu na skládku a skládkovného				
		Ostatní konstrukce a práce				152 184
		Celkem				214 453

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 51 - Dětské hřiště Malá
 číslo a název SO: IO 3.2 -
 číslo a název rozpočtu: 701 - Dětské hřiště

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 102720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní opatření dodavatele (ochrana chodců, napojení na MK) dle potřeby	KČ	1,000	1 000	1 000
2 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dle potřeby - odsouhlasí TDI - podzemní IS	KČ	1,000	2 000	2 000
0		Všeobecné konstrukce a práce				3 000
1		Zemní práce				
3 112214		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	1,000	1 500	1 500
4 112271		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR 1-4 pískoviště, včetně odvozu na skládku a skládkovného s příplatkem za ztížený přesun v tl. 0,3 m, 10% navíc	M3	1,320	4 000	5 280
5 17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek do pískoviště	M3	1,200	1 600	1 920
6 18090		VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH travnaté plochy poškozené mechanizací v době výstavby z vhodného vytěženého humusu - uvedení do původního stavu - dohumusování + osetí (odborný odhad)	M3	2,000	1 000	2 000
7 18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 dopadová plocha	M2	4,000	600	2 400
8 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ nakoupený humus pro dozelenění kolem pískoviště v tl. 0,1-0,15 m, 10% navíc - odborný odhad	M3	1,100	1 000	1 100
9 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10,000	75	750
10 18431		PŘESAŽOVÁNÍ KERŮ S BALEM	KUS	3,000	100	300
11 18441		PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ S BALEM javor	KUS	1,000	200	200
1		Zemní práce				15 450
9		Ostatní konstrukce a práce				

12 916711	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - DOD A MONTÁŽ D+M provozní řád + tabulka publicity (300*400 mm) - upřesní se dle nabídky dodavatele	KUS	1,000	3 460	3 460
13 93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ lavička- pouze montáž, dodávka objednatel	KUS	1,000	1 400	1 400
14 93610a	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ D+M 3 prvky + písковиště včetně zemních prací - výčet TZ	KPL	1,000	102 342	102 342
15 93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ odpadkový koš - pouze montáž	KUS	1,000	680	680
9	Ostatní konstrukce a práce				107 882
	Celkem				126 332

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

[illegible]

PISKVIŠTĚ

ZELEŇ

Zeleni

BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR OKOLO HERNÍCH PRVKŮ

UČENIE O VÝVOJI ŽIVOTNÝCH BYTOSTÍ

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ: LAVIČKA

ODPADKOC

☐ LAVIČKA ☒ O UMÍSTĚNÍ ROZHODNE INVESTOR

o ODPADKOVÝ KOŠ

VYTYČOVACÍ BODY:

Č.	Y	X
1	689688,39	978500,34
2	689690,35	978498,07
3	689688,08	978496,11
4	689686,12	978498,38
5	689684,13	978495,90
6	689684,39	978492,52
7	689681,83	978489,89


**POZOR! KOTVY HERNÍCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ UMÍSTĚNY MIMO OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU!
PARĚZY ODSTRANĚVAT V SOULADU S VYJÁDRĚNÍM RWE!**

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI ! BĚHEM VÝSTAVBY JE NUTNO DOTČENÉ SÍTĚ OCHRANIT.

C. Výkresová část

Odpovědný projektant/ Vypracoval	Kreslil	 ALB plus spol. s r.o. Bežický vojvodina 114204, Luminosa 1 Tel./fax: 085 109 494 DIČ: CZ232242593, IČ: 62242593
Ing. Petr Rendl	Ing. Petra Vajsejtlová	
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Dětské hřiště v ul. Puškinova v Liberci (k. ú. Pilínkov)		
Situace		Stupeň DSP Datum 12/2013 Čís.zak.: Čís.soupr.: 07/2013 M 1:250 Č.v. C.2

SITUACE 1:250

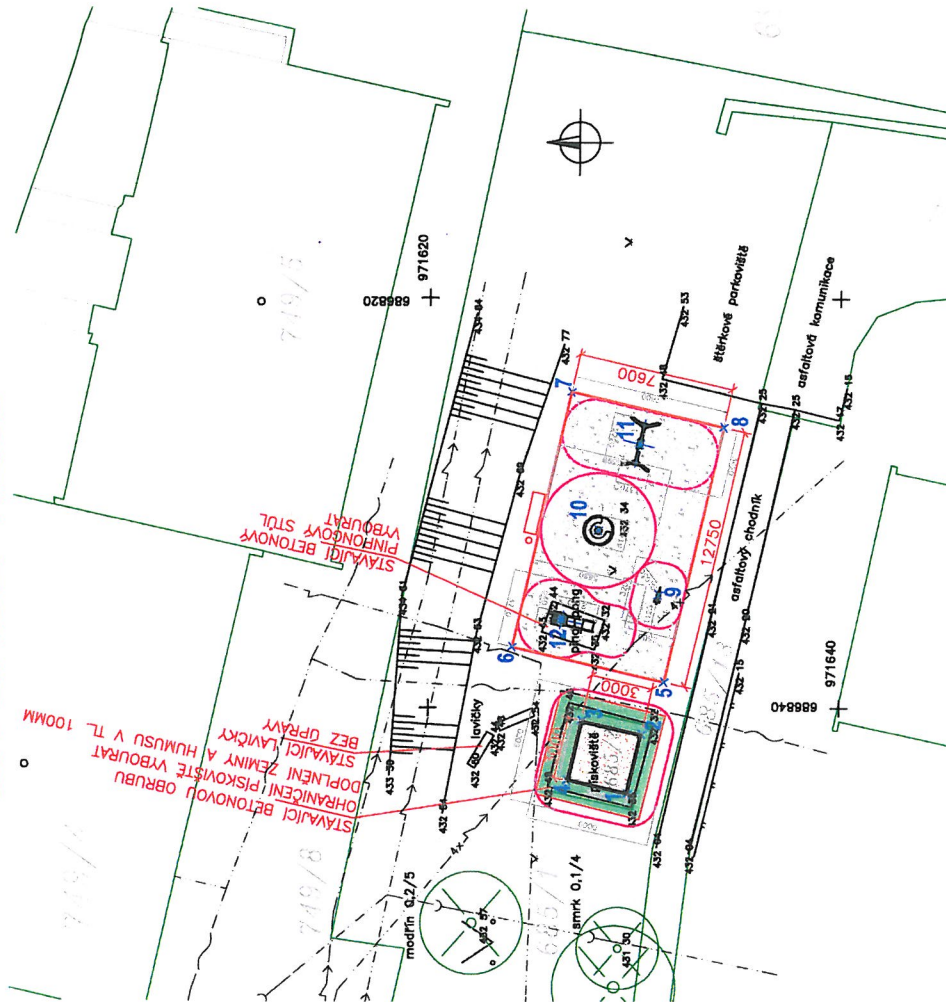

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- orientace předmětů vodovodu
- orientace předmětů kanalizace
- orientace předmětů plynovodu
- orientace předmětů elektr. vedení
- orientace předmětů telefon. vedení
- orientace předmětů optického vedení
- orientace předmětů kabelového vedení
- orientace předmětů sálavacího vedení
- orientace předmětů sálavacího kabelu

LEGENDA :

- PÍSKOVIŠTĚ
- DROBNÝ KAČÍREK FRAKCE 2-8 – DOPADOVÉ PLOCHY – TL. 300 mm
- ZELEŇ
- BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR OKOLO HERNÍCH PRVKŮ
- MĚSTSKÝ MOBILIÁR: ☐ LAVIČKA ☐ O UMÍSTĚNÍ ROZHODNE INVESTOR
- ODPADKOVÝ KOŠ

WYTÝČOVACÍ BODY:

Č.	Y	X
1	686844,23	971629,74
2	686841,31	971630,42
3	686840,64	971627,49
4	686843,56	971626,82
5	686838,74	971631,49
6	686837,04	971624,08
7	686824,61	971626,94
8	686826,32	971634,35
9	686834,49	971631,19
10	686831,35	971628,26
11	686827,14	971630,26
12	686835,69	971626,50

POZOR! KOTVY HERNÍCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ UMÍSTĚNY MIMO WYTÝČENÝ A PŘÍČNOU SONDOU OVĚŘENÝ PRŮBĚH VYZNAČENÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO WYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI! BĚHEM VÝSTAVBY JE NUTNO DOTČENÉ SÍTĚ OCHRÁNIT.

C. Výkresová část

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	ALB plus spol. s r.o. Bedich Bedichová 11604, LUMBEK 1 Tel. 602 88 109 494 916-0202242863, 916-0202242863
Ing. Petr Rendl	Ing. Petra Vajsejtlová	Ivana Dufková	
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1			Stupeň DSP
Dětské hřiště v ul. Neklanova v Liberci (k. ú. Ruprechtice)			Datum 12/2013
			Čís.zak.: 05/2013
			Čís.soupr.: 1
			M 1:250
			Č.v. C. 2
Situace			

Technical drawing of a building layout, likely a floor plan or site plan, showing various rooms and structural elements. The drawing includes a north arrow pointing towards the top right. Key features include:

- Rooms and Areas:**
 - Room 1: A small room at the top left, labeled "1" in blue.
 - Room 2: A central room, labeled "2" in blue.
 - Room 3: A room to the left of Room 2, labeled "3" in blue.
 - Room 4: A room below Room 2, labeled "4" in blue.
 - Room 5: A room at the bottom left, labeled "5" in blue.
 - Room 6: A room to the left of Room 5, labeled "6" in blue.
 - Room 7: A room at the bottom right, labeled "7" in blue.
- Structural Elements:**
 - Stairs: Indicated by a set of parallel lines and the word "schodisko" (staircase) in blue.
 - Entrance: Marked with a red circle and the word "vstup" (entrance) in blue.
 - Windows: Represented by rectangles with diagonal lines, labeled "okno" (window) in blue.
 - Doors: Represented by arcs, labeled "dveře" (doors) in blue.
- Annotations and Dimensions:**
 - "ul. Malá" (Small Street) is written in red at the top.
 - "IX. PÁŘEZ ODSTRANIT" (Remove IX. Section) is written in red at the top right.
 - "asfaltová komunikace" (asphalt communication) is written in blue in two locations.
 - Dimensions and coordinates are marked along the edges, such as "421.64", "422.10", "422.30", "422.35", "423.10", "423.15", "423.20", "423.25", "423.30", "423.35", "423.40", "423.45", "423.50", "423.55", "423.60", "423.65", "423.70", "423.75", "423.80", "423.85", "423.90", "423.95", "424.00", "424.05", "424.10", "424.15", "424.20", "424.25", "424.30", "424.35", "424.40", "424.45", "424.50", "424.55", "424.60", "424.65", "424.70", "424.75", "424.80", "424.85", "424.90", "424.95", "425.00", "425.05", "425.10", "425.15", "425.20", "425.25", "425.30", "425.35", "425.40", "425.45", "425.50", "425.55", "425.60", "425.65", "425.70", "425.75", "425.80", "425.85", "425.90", "425.95", "426.00", "426.05", "426.10", "426.15", "426.20", "426.25", "426.30", "426.35", "426.40", "426.45", "426.50", "426.55", "426.60", "426.65", "426.70", "426.75", "426.80", "426.85", "426.90", "426.95", "427.00", "427.05", "427.10", "427.15", "427.20", "427.25", "427.30", "427.35", "427.40", "427.45", "427.50", "427.55", "427.60", "427.65", "427.70", "427.75", "427.80", "427.85", "427.90", "427.95", "428.00", "428.05", "428.10", "428.15", "428.20", "428.25", "428.30", "428.35", "428.40", "428.45", "428.50", "428.55", "428.60", "428.65", "428.70", "428.75", "428.80", "428.85", "428.90", "428.95", "429.00", "429.05", "429.10", "429.15", "429.20", "429.25", "429.30", "429.35", "429.40", "429.45", "429.50", "429.55", "429.60", "429.65", "429.70", "429.75", "429.80", "429.85", "429.90", "430.00", "430.05", "430.10", "430.15", "430.20", "430.25", "430.30", "430.35", "430.40", "430.45", "430.50", "430.55", "430.60", "430.65", "430.70", "430.75", "430.80", "430.85", "430.90", "430.95", "431.00", "431.05", "431.10", "431.15", "431.20", "431.25", "431.30", "431.35", "431.40", "431.45", "431.50", "431.55", "431.60", "431.65", "431.70", "431.75", "431.80", "431.85", "431.90", "431.95", "432.00", "432.05", "432.10", "432.15", "432.20", "432.25", "432.30", "432.35", "432.40", "432.45", "432.50", "432.55", "432.60", "432.65", "432.70", "432.75", "432.80", "432.85", "432.90", "432.95", "433.00", "433.05", "433.10", "433.15", "433.20", "433.25", "433.30", "433.35", "433.40", "433.45", "433.50", "433.55", "433.60", "433.65", "433.70", "433.75", "433.80", "433.85", "433.90", "433.95", "434.00", "434.05", "434.10", "434.15", "434.20", "434.25", "434.30", "434.35", "434.40", "434.45", "434.50", "434.55", "434.60", "434.65", "434.70", "434.75", "434.80", "434.85", "434.90", "434.95", "435.00", "435.05", "435.10", "435.15", "435.20", "435.25", "435.30", "435.35", "435.40", "435.45", "435.50", "435.55", "435.60", "435.65", "435.70", "435.75", "435.80", "435.85", "435.90", "435.95", "436.00", "436.05", "436.10", "436.15", "436.20", "436.25", "436.30", "436.35", "436.40", "436.45", "436.50", "436.55", "436.60", "436.65", "436.70", "436.75", "436.80", "436.85", "436.90", "436.95", "437.00", "437.05", "437.10", "437.15", "437.20", "437.25", "437.30", "437.35", "437.40", "437.45", "437.50", "437.55", "437.60", "437.65", "437.70", "437.75", "437.80", "437.85", "437.90", "437.95", "438.00", "438.05", "438.10", "438.15", "438.20", "438.25", "438.30", "438.35", "438.40", "438.45", "438.50", "438.55", "438.60", "438.65", "438.70", "438.75", "438.80", "438.85", "438.90", "438.95", "439.00", "439.05", "439.10", "439.15", "439.20", "439.25", "439.30", "439.35", "439.40", "439.45", "439.50", "439.55", "439.60", "439.65", "439.70", "439.75", "439.80", "439.85", "439.90", "439.95", "440.00", "440.05", "440.10", "440.15", "440.20", "440.25", "440.30", "440.35", "440.40", "440.45", "440.50", "440.55", "440.60", "440.65", "440.70", "440.75", "440.80", "440.85", "440.90", "440.95", "441.00", "441.05", "441.10", "441.15", "441.20", "441.25", "441.30", "441.35", "441.40", "441.45", "441.50", "441.55", "441.60", "441.65", "441.70", "441.75", "441.80", "441.85", "441.90", "441.95", "442.00", "442.05", "442.10", "442.15", "442.20", "442.25", "442.30", "442.35", "442.40", "442.45", "442.50", "442.55", "442.60", "442.65", "442.70", "442.75", "442.80", "442.85", "442.90", "442.95", "443.00", "443.05", "443.10", "443.15", "443.20", "443.25", "443.30", "443.35", "443.40", "443.45", "443.50", "443.55", "443.60", "443.65", "443.70", "443.75", "443.80", "443.85", "443.90", "443.95", "444.00", "444.05", "444.10", "444.15", "444.20", "444.25", "444.30", "444.35", "444.40", "444.45", "444.50", "444.55", "444.60", "444.65", "444.70", "444.75", "444.80", "444.85", "444.90", "444.95", "445.00", "445.05", "445.10", "445.15", "445.20", "445.25", "445.30", "445.35", "445.40", "445.45", "

[illegible]

PÍSKOVIŠTĚ

BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR OKOLO HERNÍCH PRVKŮ

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ: ☐ LAVIČKA ☒ O UMÍSTĚNÍ ROZHODNE INVESTOR
o ODPADKOVÝ KOŠ

Č.	Y	X
1	687865,56	977752,84
2	687863,93	977751,68
3	687865,09	977750,05
4	687866,72	977751,21
5	687860,33	977749,35
6	687869,14	977749,57
7	687868,64	977754,33

POZOR! KOTVY HERNÍCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ UMÍSTĚNY MIMO VYTÝČENÝ A PŘÍČNOU SONDOU OVĚŘENÝ PRŮBĚH VYZNAČENÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI ! BĚHEM VÝSTAVBY JE NUTNO DOTČENÉ SÍTĚ OCHRÁNIT.

C. Výkresová část

Odpovědný projektant/ Vypracoval	Kreslil	 ALB plus spol. s r.o. Sešilovské nábřeží 1140/4, Lumbarský Tel./fax: +420 109 434 DIČ: CZ32242863, IČ: 62242863		
Ing. Petr Rendl	Ing. Petra Vajsejtlová			
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1				
Dětské hřiště v ul. Malá v Liberci (k. ú. Vesec u Liberce)				
Situace				
			Stupeň	DSP
			Datum	12/2013
			Čís.zak.:	Čís.soupr.:
			06/2013	

